

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci stavby

„Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2
- Výměna oken na Domově mládeže a budově školy“

uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460

Zastoupený: Ing. Martinem Tesaříkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Vilém Urbanek, oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: 585 508 836, 725 821 981

e-mail: v.urbanek@kr-olomoucky.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Mrňka a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
4984, dne 8. srpna 2007

Se sídlem: Konice, Bídov 463, PSČ 79852

IČ: 277 40 358

DIČ: CZ 27740358

Zastoupený: Bohumírem Mrňkou, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Miroslav Ellner
telefon/fax: 733 314 801
e-mail: ellner@mrnka.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 1890967399/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele č. KUOK 21669/2012 (SpZn: KÚOK/21669/2012/OIEP/358) ze dne 10.05.2012 a nabídky zhotovitele ze dne 30.05.2012 vedené pod. č. 330-12-1 na tuto výzvu zavazuje provést pro objednatele dílo, kterým je dodávka stavby

**„Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2
- Výměna oken na Domově mládeže a budově školy“**

(dále také „dílo“)

a to podle předané projektové dokumentace, zpracované Ing. Jiřím Tomečkem, místem podnikání Zelená 584/6, 779 00, Olomouc - Neředín, IČ: 15505961 (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedeného díla a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla.

2. Místem provádění díla je hlavní objekt školy příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2, se sídlem Pöttingova 2, 771 00 Olomouc, IČ: 00600938

3. Rozsah předmětu díla spočívá v plnění podle předané projektové dokumentace. Předmětem díla je výměna kastlových oken, vstupních dveří a oprava sklepních oken ve dvorní části hlavního objektu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga v Olomouci.

Stávající okna (mimo sklepní) budou vybourána a nahrazena replikami stejného vzhledu a členění s tím, že vnitřní křídla budou opatřeny izolačním dvojsklem $U = 1,10 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$. Barva oken bude odpovídat původnímu odstínu. Magistrát města Olomouce, odd. památkové péče vydal k plánované výměně oken závazné stanovisko (které je součástí zadávací dokumentace) pod Č. j. SMOI/OPP/20/516/2012/Za, ze dne 3. 5. 2012 a které je nutno respektovat, mimo jiné odsouhlasení prototypu okna, včetně barevného odstínu. Dále budou vyměněny vnější parapety z pozinkovaného plechu a vnitřní dřevěné parapety. Žaluzie budou osazeny dle výpisu prvků. Okna a dveře po osazení budou zednický zapravena včetně okenních špalet a nových maleb. Sklepní okna budou přesklena do stávajících rámců a nově natřena. Poškozené části budou vyměněny za nové dle původního vzhledu. Objekt je památkově chráněn a oprava oken podléhá ohlášení a souhlasu odd. památkové péče MMO s navrženým řešením.

4. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou objednatele č. KUOK 21669/2012 (SpZn: KÚOK/21669/2012/OIEP/358) ze dne 10.05.2012, přijatou nabídkou zhotovitele ze dne 30.05.2012 vedenou pod. č. 330-12-1, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době uzavření smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a předpisy souvisejícími.

5. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících s realizací stavby jako je např. zpracování potřebné realizační dokumentace, zařízení staveniště, likvidace vzniklých odpadů (stavební suť apod.), provedení veškerých souvisejících zkoušek a revizí a uvedení všech dalších povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu.
6. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:
 - a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla;
 - b) provedení podrobné fotodokumentace dotčeného díla, a to před zahájením a po dokončení stavebních prací;
 - c) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s dodržováním bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
 - d) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - e) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby;
 - f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně i jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů;
 - g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;
 - i) zřízení a odstranění zařízení staveniště;
 - j) odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká i vybouraných hmot a stavební suť) včetně poplatku za uskladnění;
 - k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - l) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.;
 - m) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby zejména:
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
7. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:
 - a) do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
 - b) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“;

- c) každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
8. Předmět díla je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu smlouvy je možná pouze ze strany objednatele.
9. Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu díla o dodávky menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 10% z celkové ceny díla bez DPH), případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 1. Termín zahájení prací: **01.07.2012**
- 2. Termín dokončení díla: **20.08.2012**
- 3. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby dle čl. II. této smlouvy, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelům požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad, nedodělků, předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu a uvedení všech dalších povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu.
- 4. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 5. Objednatel přistoupí po dohodě se zhotovitelem na přiměřené prodloužení lhůty plnění v následujících případech:
 - a) dojde-li z důvodu na straně objednatele k prodlení s předáním a převzetím staveniště (termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště);
 - b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací, nejedná-li se o případ uvedený v čl. III. odst. 4. této smlouvy;
 - c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele.

IV. CENA DÍLA

1. Celková cena za provedení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH..... 1 381 581,00 Kč
20% DPH 276 316,00 Kč
cena celkem včetně DPH..... 1 657 897,00 Kč

(slovy: Jedenmilionšestsetpadesátšedmtisícosmsetdevadesátšedm korun českých)

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele specifikované položkovými rozpočty a textovou částí. Jedná se o cenu skladebnou, tj. o cenu, která je založena na principu pevných jednotkových cen, na jejichž změny či úpravy nelze po uzavření smlouvy vznášet žádné dodatečné požadavky.
3. Cena uvedená v čl. IV. odst. 1. této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládky, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro realizaci stavby; všechny zkoušky a revize potřebné ke kolaudačnímu řízení a výkresovou dokumentaci skutečného provedení apod.).
4. Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla vymezeného v čl. II. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
5. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací dle čl. X. odst. 15. této smlouvy písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a smluvně upraveny dodatkem ke smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné ohlášení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě měsíčních faktur – daňových dokladů, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Jednotlivé faktury zhotovitel vystaví vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který je faktura vystavována. Zhotovitel doloží k fakturám zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací po položkách dle rozpočtu. Faktury budou hrazeny až do výše 90% celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10% sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury vystavené do 15 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla na základě faktury, vystavené nejpozději do 15 dnů od jejich odstranění).
2. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 28 ZDPH a musí navíc obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.
3. Splatnost faktur je **30 dnů** od jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
4. Platební podmínky uvedené v čl. V. této smlouvy platí i pro případnou úhradu písemně sjednaných víceprací.
5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

VI. SMLUVNÍ SANKCE

1. V případě dílčích neplnění smluvních závazků se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:
 - a) Prodlení s dokončením díla:

Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle čl. III. odst. 2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení.
 - b) Neodstranění vad a nedodělků z předávacího a kolaudačního řízení:

Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky z předávacího a kolaudačního řízení v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu či nedodělek a den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku.

- c) Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady.

- d) Neodstranění záručních vad:

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé této záruční vady.

- e) Nevyklizení staveniště:

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každý den prodlení.

- f) Prodlení s úhradou ceny:

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Případným uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok smluvních stran na úhradu vzniklých škod přesahujících uhrazené smluvní pokuty.

VII. SUBDODAVATELÉ

1. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí osobu (subdodavatele). Pokud zhotovitel zadá celé dílo nebo část díla subdodavateli před zahájením prací na díle nebo v průběhu provádění díla, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli min. 5 dnů před zahájením příslušných prací a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 %** z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací oběma smluvními stranám trvale přístupný.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele;
 - b) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele;

- c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace;
 - d) přehled všech provedených zkoušek jakosti;
 - e) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
 - f) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
 4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
 5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
 8. Zhotovitel je povinen předat po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

IX. STAVENIŠTĚ

Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště prosto práv třetí osoby **do termínu uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy.**
2. Převzetím staveniště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování příslušných protipožárních opatření a za provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a platnými právními normami.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a celé staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.

4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.
5. Provizorní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na dokumentaci skutečného provedení díla, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 2. této smlouvy a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.
3. Věci, které jsou potřebné k provádění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele či pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím. O této kontrole bude sepsán zápis o převzetí zakrývaných prací.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat ČSN a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti.
9. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce, kraje či státu.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užívání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
12. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
13. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele s tím, že výše pojistné částky sjednaná ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší než je cena díla dle čl. IV. této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN a jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu uvést poškozenou věc do původního stavu, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak použije ceny, které nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. O těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla.
16. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
17. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo být uskutečněny jiné změny proti projektové dokumentaci.

XI. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit předávací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré doklady o provedení stavby, které jsou nutné pro řádné užívání a provozování díla. Jedná se zejména o doklady:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla – tři paré;
 - b) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými (certifikáty o shodě);
 - c) protokoly o zkouškách použitých materiálů;
 - d) protokoly o provedených zkouškách;
 - e) zápisy o převzetí zakrývaných prací;
 - f) originál stavebního deníku.

Podepsání zápisu o předání a převzetí díla (termín dokončení) je podmíněno rovněž dosažením předepsaných parametrů a doložením výsledků zkoušek stavební části stavby.

Totéž se vztahuje i na případné jednotlivé dílčí části díla předávané samostatně. Objednatel má právo nepřevzít dílo v případě neúspěšného provedení jedné ze všech potřebných zkoušek k bezproblémovému fungování díla.

3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. Zhotovitel se zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace o předmětu a provedení díla a odstraní případné vady a nedodělky, a za úhradu provede požadované vícepráce vyplývající z kolaudačního řízení.

XII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále zhotovitel odpovídá za škody, které objednateli vzniknou vadným plněním smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli.
3. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli.

Tyto záruční listy musí být řádně vyplněné a musí být předloženy při předání a převzetí díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.
4. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektovou dokumentací a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací, vandalizmem a na vady materiálu dodaného objednatelem.
5. Objednatel je povinen vady písemně nebo faxem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo faxem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
8. V případě výskytu vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit. Práce na odstranění oprávněně reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, nedojde-li k písemné dohodě smluvních stran o jiném termínu, v případě vady bránící užívání (havárie) nejpozději do 24 hodin po doručení oznámení o vadě, dovolí-li to klimatické podmínky. Vada bude odstraněna v co nejkratším termínu. V případě, že zhotovitel nezačne odstraňování vady nebo neodstraní vadu v termínech v tomto odstavci uvedených, má objednatel právo objednat na náklady zhotovitele odstranění vad/y u jiného subjektu. Tyto náklady objednatel písemně uplatní u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 21 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury).

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé mu v souvislosti s odstraněním vady.
10. Pokud není stanoveno jinak, řídí se kvalita stavebních prací všemi ČSN (a případně jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaném Českým normalizačním institutem.
11. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, objednatel předloží takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

XIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 20 dnů od doručení písemného oznámení objednatele, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na staveništi nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od

smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než 1 měsíc, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.
6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.
7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže bylo příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele, a to i v době patnácti dnů od prohlášení konkursu, nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s platbou faktury déle než 30 dní.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s projektovou dokumentací a s výzvou objednatele č. KUOK 21669/2012 (SpZn: KÚOK/21669/2012/OIEP/358) ze dne 10.05.2012 na dodávku stavby pro shora uvedené dílo před podáním své cenové nabídky ze dne 30.05.2012 a podpisem této smlouvy si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a zavazuje se touto výzvou, nabídkou zhotovitele ze dne 30.05.2012 a projektovou dokumentací řídit.
2. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených číslovaných dodatků.
5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh dle odst. 8. tohoto článku, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu s platnými předpisy v oblasti poskytování informací.
8. Přílohy smlouvy:
Příloha č.1: „Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“
Příloha č.2: „Položkový rozpočet“
9. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 04.06.2012 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2012, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 01. 06. 2012

Za objednatele:

Olomoucký kraj
Ing. Martin Tesařík
hejtman



V Konici dne: 05. 06. 2012

Za zhotovitele:

Mrňka a.s.
Bohumír Mrňka
předseda představenstva



**Čestné prohlášení příjemce (objednatel)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH**

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno) : Olomoucký kraj
Adresa/ sídlo: Jeremenkova 40a, OLOMOUC, PSČ 779 00
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Oprávněná osoba: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Název (jméno) žadatele: Mrřka a.s.
Adresa/sídlo žadatele: Konice, Bídov 463, PSČ 79852
IČ: 27740358
DIČ: CZ 27740358
Oprávněná osoba: Bohumír Mrřka, jednatel společnosti


Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH,*“ zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. 2012/02333/OIEP/DSM pro akci „*Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2 - Výměna oken na Domově mládeže a budově školy*“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Olomouci dne 01. 06. 2012


.....
Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje





Sídlo: Bídov 463, 798 52 Konice, Olomoucký kraj
Tel.: +420 582 396 717, Fax: +420 582 397 717

IČ: 27740358
DIČ: CZ27740358

E-mail: mrnka@mrnka.cz
Web: www.mrnka.cz

ZÁKAZNÍK:

Olomoucký kraj

Adresa:

Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc - Hodolany

Dodací adresa:


Pöttingova 624/2
779 00 Olomouc

Kontaktní osoba:

Ing. Martina Jurečková
Telefon: +420 585 508 281
E-mail: m.jureckova@kr-olomoucky.cz

Projekt: 330-12 - SZŠ a VOŠZ Olomouc

Doklad: 330-12-1



Okna a dveře vyrábíme dle posledních technologických poznatků, z certifikovaných komponent, na kvalitním strojním vybavení, a díky tradici od r.1990 Vám můžeme garantovat jak dobré tepelné technické a užité vlastnosti, tak rovněž kvalitní řemeslné zpracování.

konstrukce:

- hloubka deštění do 250 mm, respektive bude zachována, všechna křídla budou otevírána dovnitř;
- vnější křídla s jednoduchým sklem tl.4 mm, se standardní profilací pohledové šířky profilů 55 mm;
- vodorovný poutec bude s jednoduchým "historizujícím" zdobením;
- s dřevěnými křídlovými okapnicemi („wassernosy“);
- vnitřní křídla se subotním dvojsklem, se standardní profilací pohledové šířky profilů 65 mm;

výchozí materiál: pro křídla a rámy dvoivrstvá lepená lamela smrková napoiovaná (cinkovaná), pro ostatní části - kastlík (deštění) masivní smrk;

povrchová úprava: vodou ředitelnými hmotami renomované značky REMMERS, s nimiž dosahujeme vysoké kvality a životnosti díky hloubkové impregnaci vícenásobným máčením a silnovrstvě lazuře (krycí barvě) aplikované vysokotlakým nástřikem, která chrání proti UV-záření a dokáže regulovat vlhkost;


kování:


- okenní závěsy zakouvací, na křídlech hranové převody ROTO (nikoliv drátové rozvory a skoby);
- vrchní kování (olivy a půlolyvy) standardně typ Casuai (dle domluvy jiný tvar i povrch);
- na vnějších křídlech nárazníky, v dolním deštění záskočky;

těsnění: jednostupňové, trvale pružné v obou křídlech;

zasklení: ve vnějších křídlech dvojsklo Float 4 / 10 argon / Planibel TopN+4 ($U_g = 1.5 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$), ve vnitřních křídlech jednoduché sklo tl.4 mm, všechna usazená v polodrážce pomocí zasklivač lišty (ne na sklenářský tmel) a těsněná silikonovým transparentním tmelem;


Výrobky splňují parametry podle §22 zákona č.22/1997 Sb. o tech.požadavcích na výrobky a dle znění nařízení vlády č.190/2002 Sb. z 10.4.2002 je vydáno ES prohlášení o shodě. Na naše výrobky poskytujeme záruku 60 měsíců počínaje dnem montáže.

Pozice	Náčrtek	Množství	Popis výrobku	Cena za 1 kus	Celková cena
To/01.1		17 ks	Profilace: OKNO DVOJITÉ DEŠTĚNÉ Název: Okno 6(12)-křídlové Rozměry: 1800 x 2640 mm Dřevina: Smrk cink Barva (e/i): RAL 1013 / RAL 1013 Výplň: 6x Jednoduché sklo 4mm; 9x DVOJSKLO 4/10TGI/4 Složení (e/i): 6x 4; 9x 4/10/4 Příčky: 3x Dřevěná příčka bez okapnice	30606	520302
		17 ks	Tep.izolace deštění extrud.polystyrénem		6035
		68 ks	Příplatek za olivu Casual mosaz leštěná		12920
		68 ks	Příplatek za půlolivu Casual mosaz leštěná		9520
		17 ks	Vnitřní parap.deska Postforming š.do 150 mm		12104
		51 ks	Vnitřní horizontální žaluzie typ Euro BRILANT III		35700
		51 ks	Vnitřní horizontální žaluzie typ Euro BRILANT III		30600
			Suma položky:		627181

To/01.2		5 ks	Profilace: OKNO DVOJITÉ DEŠTĚNÉ Název: Okno 6(12)-křídlové Rozměry: 1800 x 2640 mm Dřevina: Smrk cink Barva (e/i): RAL 1013 / RAL 1013 Výplň: 6x Jednoduché sklo 4mm; 9x DVOJSKLO 4/10TGI/4 Složení (e/i): 6x 4; 9x 4/10/4 Příčky: 3x Dřevěná příčka bez okapnice	30606	153030
		5 ks	Tep.izolace deštění extrud.polystyrénem		1775
		20 ks	Příplatek za olivu Casual mosaz leštěná		3800
		20 ks	Příplatek za půlolivu Casual mosaz leštěná		2800
		5 ks	Vnitřní parap.deska Postforming š.do 150 mm		3560
			Suma položky:		164965

Pozice	Náčrtek	Množství	Popis výrobku	Cena za 1 kus	Celková cena
--------	---------	----------	---------------	---------------	--------------

To/01.3




3 ks

Profilace: OKNO DVOJITÉ DEŠTĚNÉ
 Název: Okno 6(12)-křídlové
 Rozměry: 1800 x 2640 mm
 Dřevina: Smrk cink
 Barva (e/i): RAL 1013 / RAL 1013
 Výplň: 6x Jednoduché sklo 4mm; 9x DVOJSKLO 4/10TGI/4
 Složení (e/i): 6x 4; 9x 4/10/4
 Příčky: 3x Dřevěná příčka bez okapnice

- KUCHYŇ
 - oprava obkladu parapetu místo parap.desky;

		30606	91818
26,640 m	Tep.izolace deštění extrud.polystyrénem		1065
12 ks	Příplatek za olivu Casual mosaz leštěná		2280
12 ks	Příplatek za půlolivu Casual mosaz leštěná		1680
	Suma položky:		96843

To/02




2 ks

Profilace: OKNO DVOJITÉ DEŠTĚNÉ
 Název: Okno 7(14)-křídlové
 Rozměry: 2860 x 1300 mm
 Dřevina: Smrk cink
 Barva (e/i): RAL 1013 / RAL 1013
 Výplň: 7x Jednoduché sklo 4mm; 15x DVOJSKLO 4/10TGI/4
 Složení (e/i): 7x 4; 15x 4/10/4
 Příčky: 8x Dřevěná příčka bez okapnice

		31857	63714
2 ks	Tep.izolace deštění extrud.polystyrénem		664
28 ks	Příplatek za půlolivu Casual mosaz leštěná		3920
	Suma položky:		68298

Pozice	Náčrtek	Množství	Popis výrobku	Cena za 1 kus	Celková cena
--------	---------	----------	---------------	---------------	--------------

To/03



2 ks

Profilace: OKNO DVOJITÉ DEŠTĚNÉ
 Název: Okno 6(12)-křídlové
 Rozměry: 2450 x 1300 mm
 Dřevina: Smrk cink
 Barva (e/i): RAL 1013 / RAL 1013
 Výplň: 6x Jednoduché sklo 4mm; 12x DVOJSKLO 4/10TGI/4
 Složení (e/i): 6x 4; 12x 4/10/4
 Příčky: 6x Dřevěná příčka bez okapnice

27536

55072

15,000 m Tep.izolace deštění extrud.polystyrénem

600

4 ks Příplatek za olivu Casual mosaz leštěná

760

16 ks Příplatek za půlolivu Casual mosaz leštěná

2240


2 ks Vnitřní parap.deska Postforming š.do 150 mm

1938

Suma položky:

60610

To/04



2 ks

Profilace: OKNO DVOJITÉ DEŠTĚNÉ
 Název: Okno 5(10)-křídlové
 Rozměry: 1980 x 1300 mm
 Dřevina: Smrk cink
 Barva (e/i): RAL 1013 / RAL 1013
 Výplň: 5x Jednoduché sklo 4mm; 9x DVOJSKLO 4/10TGI/4
 Složení (e/i): 5x 4; 9x 4/10/4
 Příčky: 4x Dřevěná příčka bez okapnice

22338

44676

13,120 m Tep.izolace deštění extrud.polystyrénem

524

20 ks Příplatek za půlolivu Casual mosaz leštěná


2800

Suma položky:

48000

Pozice	Náčrtek	Množství	Popis výrobku	Cena za 1 kus	Celková cena
--------	---------	----------	---------------	---------------	--------------

To/05



2 ks

Profilace: OKNO DVOJITÉ DEŠTĚNÉ
 Název: Okno 5(10)-křídlové
 Rozměry: 1680 x 1300 mm
 Dřevina: Smrk cink
 Barva (e/i): RAL 1013 / RAL 1013
 Výplň: 5x Jednoduché sklo 4mm; 9x DVOJSKLO 4/10TGI/4
 Složení (e/i): 5x 4; 9x 4/10/4
 Příčky: 4x Dřevěná příčka bez okapnice

21222

42444

11,920 m

Tep.izolace deštění extrud.polystyrénem

476

20 ks

Příplatek za půlživu Casual mosaz leštěná

2800

2 ks


Vnitřní parap.deska Postforming š.do 150 mm

1328

Suma položky:

47048

To/06



1 ks

Profilace: OKNO DVOJITÉ DEŠTĚNÉ
 Název: Okno 2(4)-kř. štulpové, hl.křídlo pravé
 Rozměry: 1000 x 1400 mm
 Dřevina: Smrk cink
 Barva (e/i): RAL 1013 / RAL 1013
 Výplň: 2x Jednoduché sklo 4mm; 6x DVOJSKLO 4/10TGI/4
 Složení (e/i): 2x 4; 6x 4/10/4
 Příčky: 4x Dřevěná příčka bez okapnice

13796

13796

4,800 m

Tep.izolace deštění extrud.polystyrénem

192

2 ks

Příplatek za olivu Casual mosaz leštěná

380

1 ks

Příplatek za půlživu Casual mosaz leštěná

140

1 ks

Vnitřní parap.deska Postforming š.do 150 mm

396

Suma položky:

14904

Přísl-1



283,480 m


Okenní flexi-pásky např.systému illbruck I3 :
 Expandační páska je dobré řešení pro trvalé utěsnění spár mezi různými materiály, v tomto případě mezi vnější plochou ráu a ostěním;


25

7087

Suma položky:


7087

Pozice	Náčrtek	Množství	Popis výrobku	Cena za 1 kus	Celková cena
To/07		7 ks	Celková oprava stávajících sklepních ocel.oken - demontáž prosklení; - oprava rámu s výměnou částí očištění a nátěr; - očištění a nátěr křídel; - nové zasklení na silik.tmel;		
				1000	7000
			Suma položky:		7000

To/08		1 ks	Celková oprava stávajícího sklepního ocel.okna - demontáž prosklení; - oprava rámu s výměnou částí očištění a nátěr; - očištění a nátěr křídel; - nové zasklení na silik.tmel;		
				2000	2000
			Suma položky:		2000

Pozice	Náčrtek	Množství	Popis výrobku	Cena za 1 kus	Celková cena
--------	---------	----------	---------------	---------------	--------------

Td/01

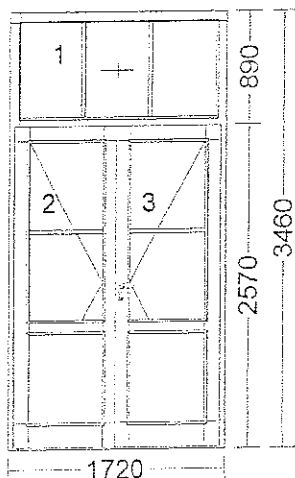

1 ks

Profilace: DVEŘE IV68
 Název: Dveře vstupní 2-křídlové s fixním nadsvětlíkem
 Rozměry: 1720 x 3460 mm
 Dřevina: Dub fixní
 Barva (e/i): Nátěr dle domluvy
 Výplň: 3x DVOJSKLO 4/16/4 Ug=1,1; 2x Výplň 24 mm jednostranný náklížek
 Spec.sklo 1: 3x Stratobel 33.2 clear 6,8mm
 Složení (e/i): 3x 7/16/4; 2x 24
 Příčky: 2x Dřevěná příčka svislá 110 mm;
 8x Nalepovací příčka+duplex 30mm

- dveře 2-křídlové symetrické
- DOVNITŘ otvíravé, hl.křídlo PRAVÉ, pro stavební otvor 165 x 248 cm od čisté podlahy;
- křídla rámová ve "zdobném" provedení (s oboustranným olistováním výplní); členěná příčkou, částečně prosklená, spodní pole - sendvič.panel 24 mm s jednostranným náklížkem;
- nízký AL-práh s přerušením tepelného mostu,
- tříšťelkový bezp.zámek GU-Security vč.vložky;
- seřiditelné panty ROTO Easy 3D;
- 5-stavítková vložka FAB 2024 D/40+55;

36466

36466


1 ks

Klika-madlo, typ Marseille-nerez, překrytí vložky

Suma položky:

36466

Td/02

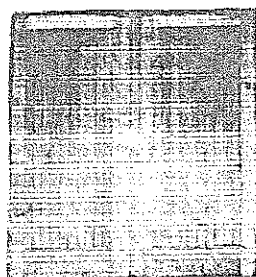

1 ks





Celková oprava stávajících dřevěných dveří
 - oprava rámu s výměnou částí očištění a nátěr;
 - očištění, nejnnutnější opravy a nový nátěr;
 - výměna kování;
 - doplnění okop.plechu;





5000

5000


Suma položky:

5000

Pozice	Náčrtek	Množství	Popis výrobku	Cena za 1 kus	Celková cena
Td/03		1 ks	Celková oprava stávajících dřevěných dveří - oprava rámu s výměnou částí očištění a nátěr; - očištění, nejnutnější opravy a nový nátěr; - výměna kování; - doplnění okop.plechu;		
				5000	5000
			Suma položky:		5000
Td/04		1 ks	Celková oprava stávajících ocel. dveří - demontáž prosklení, oprava kování; - oprava rámu s výměnou částí očištění a nátěr; - očištění a nátěr křídel; - nové zasklení na silikon;		
				5000	5000
			Suma položky:		5000
Služ-1		1 Celek	Přeprava výrobků: - přeprava výrobků Konice - stavba 30 km včetně přesunu hmot;		
				2500	2500
			Suma položky:		2500
Služ-2		293,840 m	Demontáž původních výplní: - vysazení křídel, rozřezání a vybourání rámu, vynesení mimo budovu vč.případné sutě, hrubý úklid - ceněno jako komplet		
				40	11753
			Suma položky:		11753

Pozice	Náčrtek	Množství	Popis výrobku	Cena za 1 kus	Celková cena
Služ-3		293,840 m	Montáž výrobků: - ustavení, zakotvení, zatěsnění PUR-pénou bez jejího ořezání po vytvrdnutí; - včetně základního seřízení ceněno jako komplet ;		
				130	38199
			Suma položky:		38199
Služ-4		293,840 m	Zednické práce: - standardní zapravení vnitřního ostění včetně vyrovnání parapetu; - včetně vymalování, ceněno jako komplet ;		
				300	88151
			Suma položky:		88151
Služ-5		1 Celek	Odvoz a likvidace: - naložení, odvoz a likvidace původních výplní včetně případné sutě;		
				20000	20000
			Suma položky:		20000
Služ-6		63,940 m	Klempířská: - oplechování oken titanzinkový plech tloušťky min.0,7 mm rozvinuté šířky do 330 mm		
				400	25576
			Suma položky:		25576

suma položek bez slevy		1561451
Sumy slev pro skupinu zboží: Děštěná okna (Okno dvojité deštěné)	-14,85 %	-173766
Sumy slev pro skupinu zboží: Dveře (Dveře vnější)	-14,34 %	-6103
Suma položek		1381581
Cena bez DPH		1381581
DPH 20%	20,00 %	276316
Částka k zaplacení		1657897

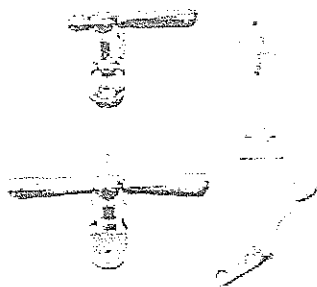


POMOCNÁ ILUSTRACE

Příslušenství dvojího okna:
pulovní a oliva Casual mosaz:
okenní nárazník mosaz:
okenní záskočka k zajištění vnějších křidel:



POMOCNÁ ILUSTRACE

Parapetní desky vnitřní Postromung:
Vnitřní parapetní desky s nosem výšky 40 mm,
z vlhku-vzdorné dřevotřískové desky tl. 17 nebo 19 mm
se spodní stranou z vlhku-odolného materiálu
a s horní krycí vrstvou z laminátu HPL síly 0,8 mm
v dezénu dle výběru, s oglepením hran do 1,3 hloubky,
s montáží na připravený podmaz:



POMOCNÁ ILUSTRACE

Žaluzie vnitřní horizontální

- typ Euro BRILANT III montované do zasklívacích listů;
- lamely domykavé v odstínu dle výběru;
- horní profil s jemným obloukovým designem
bez čelních plastových krytek, barva dle výběru;
- boční silonová fixace;
- naklápění a vytahování lamel pomocí řetízku;

Uvedená cena platí po dobu jednoho měsíce od vyhotovení nabídky.

Termín dodání výrobků **dle podmínek soutěže.**

V případě nejasností volejte nebo pište na níže uvedený kontakt:

Ing. Miroslav Ellner : 733 314 601 / ellner@mrpka.cz

Dotazy rádi zodpovíme nebo vše ujasníme při Vaší osobní návštěvě v naší firmě.

Doufáme, že Vás cenová nabídka zaujala natolik, že k realizaci zvolíte naší firmu.

MRPKA, a.s.
Křídlová 10
250 67 Písek
IČO: 252 20 123
DIČ: CZ0025220123
